

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 034-AD-86

Lima, 31 de Enero de 1986

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, el Sr. Jorge Quispe Chuquilluri, tuvo a su cargo la ejecución de la obra: "Sembrado de Grass Estadio de Béisbol" Yahuar Huaca del Callao;

Que, habiéndose recepcionado como conforme la Obra en mención, procede autorizar la devolución del Fondo de Garantía, previa Liquidación de Cuentas, según detalle :

DETERMINACION DE LA INVERSION

Contrato Original	I/. 50,778.00
Reajuste Mano de Obra	14,419.50
TOTAL INVERSION :	I/. 65,197.50

DETERMINACION DE SALDOS

Montos Aprobados

- Contrato Original	I/. 52,000.00
- Menos Reducción de Obra aprobado por la pte. Resol.	- 1,222.00
- Reajuste Mano de Obra aprobado por la pte. Resol.	14,419.50
TOTAL APROBADO :	I/. 65,197.50

Montos Abonados

- Valorizado Contrato Original	50,778.00
- Reajuste Mano de Obra-Memorandum N° 487-OCIE	14,419.50
	65,197.50
	Sumas Iguales

Monto Retenido

Fondo de Garantía

- 5% Valorizaciones Contrato Original	I/. 2,538.9
---------------------------------------	-------------

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA :

I/. 2,538.9

//..



RESOLUCION No. 034-AD-86

Lima, 31 de Enero de 1986

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS de la obra: "Sembrado de Grass del Estadio Béisbol del Parque Yahuar Huaca", la misma que establece un saldo a favor del Contratista: SR. JORGE QUISPE CHUQUILLURI, ascendente a :DOS MIL QUINIENTOS TREINTIOCHO Y NOVENTA CENTIMOS DE INTIS (I/. 2,538.90), correspondiente al Fondo de Garantía.

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR al Banco de la Vivienda del Perú, el Giro a favor del Sr. Jorge Quispe Ch., por el importe de I/. 2,538.90, más intereses, con cargo al citado Fondo de Garantía.

Regístrese y Comuníquese,

Victor Castagnola Maldonado
Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD

OCIE/ARH
ALE/nb.



Exp. 034-AD-86-31-01-86



ASUNTO: Liquidación Final de Cuentas -Devolución de Fondo de Garantía de la Obra: "Sembrado de Grass en el Estadio de Béisbol del Parque Yahuar Huaca".

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 014-OAJ/86



AL SEÑOR JEFE DEL IPD

- 1°.- El Contratista Sr. JORGE QUISPE CHUQUILLURI, que tuvo a su cargo la ejecución de la Obra: "Sembrado de Grass del Estadio Béisbol del Parque Yahuar Huaca" del Callao ha solicitado la Liquidación Final de Cuentas y la Devolución del Fondo de Garantía de la referida Obra. Según se desprende del Informe N° 091-UPOE-85 de 27-12-85 de la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento de la OCIE la Obra en mención ha sido recepcionada como conforme y de acuerdo a la Liquidación Final de Cuentas de la citada Obra arroja en favor del Contratista la suma de I/. 2,538.90, correspondiente al Fondo de Garantía.
- 2°.- Esta OAJ opina procedente aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Sembrado de Grass del Estadio Béisbol del Parque Yahuar Huaca", la misma que establece un saldo a favor del Contratista JORGE QUISPE CHUQUILLURI, ascendente a I/. 2,538.90 correspondiente al Fondo de Garantía así como autorizar al Banco de la Vivienda del Perú el giro a favor del indicado Contratista por el importe ya indicado más intereses con cargo al Fondo de Garantía, de conformidad con el Art. 5.12.1 del Decreto Supremo N° 34-VC-80 Reglamento General de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas.

Lima, 28 de Enero de 1986.

Atentamente,



EODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/86
TVM/rtp.

Exp.: 5425



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina de Asesoría Jurídica

21 ENE. 1986

11:15 am

RECIBIDO

INFORME Nº 013 -OCA-86

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy. Res. - Liquidación de Cuentas Obra :
"Sembrado de Grass del Estadio Béisbol del -
Parque Yahuar Huaca"
REF. : INFORME Nº 091-UPOE-85
FECHA : Enero 15 de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba la Liquidación Final de Cuentas de la Obra : "Sembrado de Grass del Estadio Béisbol del Parque Yahuar Huaca", la misma que establece un saldo a favor del Contratista señor Jorge Quispe Chuquilluri, ascendente a I/. 2,538.90 correspondiente al Fondo de Garantía. Asimismo, autoriza al Banco de la Vivienda el giro a favor del mencionado Contratista por la suma indicada más intereses con cargo al Fondo de Garantía.

La Oficina Central de Administración considera procedente su tramitación por encontrarse amparada de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. Nº 34-VC-80, el Art. 9º del Decreto Legislativo Nº 238-85.

Atentamente,

OCA/RMV.
ead.
ADJ.: Proy.Res.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTTOYA VALDERHAMA
Oficina Central de Administración



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N. 091-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. ROMELIA VALENZUELA RAMOS
ASUNTO : OBRA: SEMBRADO DE GRASS CAMPO DE BEISBOL PARQUE
ZONAL YAHUAR HUACA - CALLAO
LIQUIDACION DE OBRA
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA
REF. : EXP. # 5425
5831
FECHA : DICIEMBRE, 27 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relacion al asunto de referencia e informar lo siguiente:

Por Exp. # 5425, el Sr. Jorge Quispe Ch. Contratista de la Obra - en mencion solicita la cancelacion al saldo pendiente hasta S/. 69'096,000.00 que corresponde a:

Presupuesto Contrato	S/. 52'000,000
Reintegro Alza de Jornales	
R.S.D.#367-85(Retroactiva al 4-6-85)	14'419,500
Adicional 500M2	<u>2'676,500</u>
COSTO TOTAL OBRA:	S/. 69'096,000

Asimismo solicita Devolucion de Fondos de Garantia.

Al refereido expediente adjunta plano de levantamiento topografico del terreno sembrado de grass y la Memoria Descriptiva de la Obra.

La Oficina reviso el expediente presentado y solicito al Contratista la presentacion de los analisis de costos de las partidas del presupuesto de contrato para proceder a la revision del reajuste presentado, por cuanto el presupuesto de contrato fue elaborado por el Contratista.

Por Exp. # 5831, el contratista presenta los analisis de costos solicitados, teniendo en cuenta los antecedentes y documentos - presentados, se reviso el estudio de Reintegros presentado por concepto de alza de jornales normado por R.S.D.#367-85 vigente a partir del 04 de Junio de 1985 se encontro conforme.



-2-

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

En relacion a lo solicitado por concepto de ejecucion de obras adicionales, la oficina elaboro el plano del levantamiento del terreno correspondiente al Sembrado de Grass materia del contrato y con el cual se constato que el area sembrada de grass en el campo de Beisbol correspondia a 9,765M2, area inferior a la contratada de 10,000M2 por lo cual en la Valorizacion final se procedio a deducir el monto correspondiente a la Reduccion de Obra. No procede lo solicitado por el Contratista, respecto a Obras Adicionales.

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

Presupuesto Contrato	52'000,000	
Reduccion de Obra (-)	1'222,000	50'778,000
Reajustes por Mano de Obra		14'419,500
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	S/.	65'197.500

MONTO PAGADO:

VALORIZACIONES:

VAL.# 1	31'200,000	
VAL.# 2	15'600,000	
VAL. #3	3'978,000	50'778,000

MONTO A CANCELARSE A CONTRATISTA; POR REAJUSTES DE MANO DE OBRA	14'419,500
--	------------

MONTO RETENIDO:

FONDO D E GARANTIA:

Val. #1	1'560,000
Val. #2	780,000
Val. # 3	298,900

TOTAL FONDO DE GTIA. S/. 2'538,900

DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA:

Se reviso, la Memoria Descriptiva de la obra presentada por el Contratista y se encontro conforme.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

-3-

El Fondo de Garantía de la Obra a devolverse al Contratista asciende a la cantidad de S/. 2'538,900.00

La Supervisión de la obra la realiza CORDECALLAO.

Atentamente,



ADJ.: LO IND.
OCIE/UPOE/
RVR/as.

Romelia Valenzuela R.
ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

CON LA OPINION FAVORABLE DE ESTA JEFATURA, ELEVESE A LA DIRECCION EJECUTIVA, A FIN DE QUE SE PROCEDA A LA DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA, PREVIA LIQUIDACION DE CUENTAS. SE ADJUNTA PROYECTO DE RESOLUCION.

Enero-07-86

Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES —INRED— HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: QUISPE CHUQUILLURI JORGE OF. S/N DE 9-12-85		NUMERO 5425
Fecha de INGRESO: 11/12/85		ASUNTO: Solicitan cancelación de los S/. 69'096,000.-, por haber con- cluido con la ejecución del sem- brado de grass del campo de béis- bol del Parque Zonal Yahuar Hua- ca-Calho, para lo cual adjunta Memoria Descriptiva, etc.		
Hora: 10:15 AM				
Numero de Folios: (04) CUATRO				
Registrado por: Romeo S				
Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR		No. 5425
Remitido por:				No. de folio
Recibido por:				
Fecha Hora		Observaciones:		
		5		

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES —INRED— HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: QUISPE CHUQUILLURI JORGE		NUMERO REF:	
Fecha de INGRESO: 11/12/85		ASUNTO: Solicitan cancelación de los S/. 69'096,000.-, por haber con- cluido con la ejecución del sem- brado de grass del campo de béis- bol del Parque Zonal Yahuar Hua- ca-Calho, para lo cual adjuna Memoria Descriptiva, etc.			
Hora: 10:15 AM		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR		No. 5	
Numero de Folios: (04) CUATRO				No. de folio	
Registrado por: [Signature]				Observaciones:	
Pase a:				5	
Remitido por:					
Recibido por:					
Fecha Hora					

Pase a: [Signature]		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☒ TRAMITAR		No.	
Remitido por: [Signature]				No. de folio	
Recibido por: [Signature]				Observaciones: [Handwritten notes]	
Fecha 18.1.86 Hora				4	


Pase a: [Signature]		☐ ANTECEDENTES ☒ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☒ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR		No.	
Remitido por: [Signature]				No. de folio	
Recibido por: [Signature]				Observaciones: [Handwritten notes]	
Fecha 11.12.85 Hora				3	

Pase a: [Signature]		☐ ANTECEDENTES ☒ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR		No.	
Remitido por: [Signature]				No. de folio	
Recibido por: [Signature]				Observaciones:	
Fecha 12/12 Hora 12:15				2	

Pase a: SR. ANDRADE / D.E.		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☒ TRAMITAR		No.	
Remitido por: [Signature]				No. de folio	
Recibido por: [Signature]				04	
Fecha 11.12.85 Hora 11/12				1	



Lima, 09 de Diciembre de 1,985



Señores
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento
LIMA

Jorge Quispe Chuquilluri con L.E. N° 07433884 y con domicilio en Sebastian Barranca N° 1933 Dpto. 210 La Victoria, a Uds. me dirijo a fin de comunicarles que habiendo concluido con la ejecución del sembrado de grass del campo de Beisbol del Parque Zonal "Yahuar Huaca"- Callao, - presento a Ud. de acuerdo a la Cláusula Séptima del Contrato de Ejecución de Obra celebrada el 16 de Julio 1,985, la Memoria Descriptiva valorizada de dicha obra, a fin de que se sirva dar por concluida de mi parte - dicha obra y recepcionada por Uds.

En consecuencia agradeceré a Uds. se sirvan cancelarme el saldo pendiente hasta los S/ 69'096,000.= a que alcanza el costo total valorizado, que incluye el Adicional de 500 m2 más sembrados de acuerdo a las indicaciones recibidas y el reintegro por alza de jornales dispuesto por la R.S.D. número 367-85 del 18/07/85 vigente a partir del 04 de Junio 1,985.


Asimismo agradeceré se sirvan devolverme el fondo de garantía que ha estado retenido por esta Obra.

Atentamente,

11.12.85.

PASE A OCIE : Informar.


JAIME ANDRADE MENDOZA
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
TECNICO FORESTAR.

19/12/85

Lima, 09 de Diciembre de 1,985

Señores

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento

LIMA

Jorge Quispe Chuquilluri con L.E. N° 07433884 y con domicilio en Sebastian Barranca N° 1933 Dpto. 210 La Victoria, a Uds. me dirijo a fin de comunicarles que habiendo concluido con la ejecución del sembrado de grass del campo de Beisbol del Parque Zonal "Yahuar Huaca"- Callao, - presento a Ud. de acuerdo a la Cláusula Séptima del Contrato de Ejecución de Obra celebrada el 16 de Julio 1,985, la Memoria Descriptiva valorizada de dicha obra, a fin de que se sirva dar por concluida de mi parte - dicha obra y recepcionada por Uds.

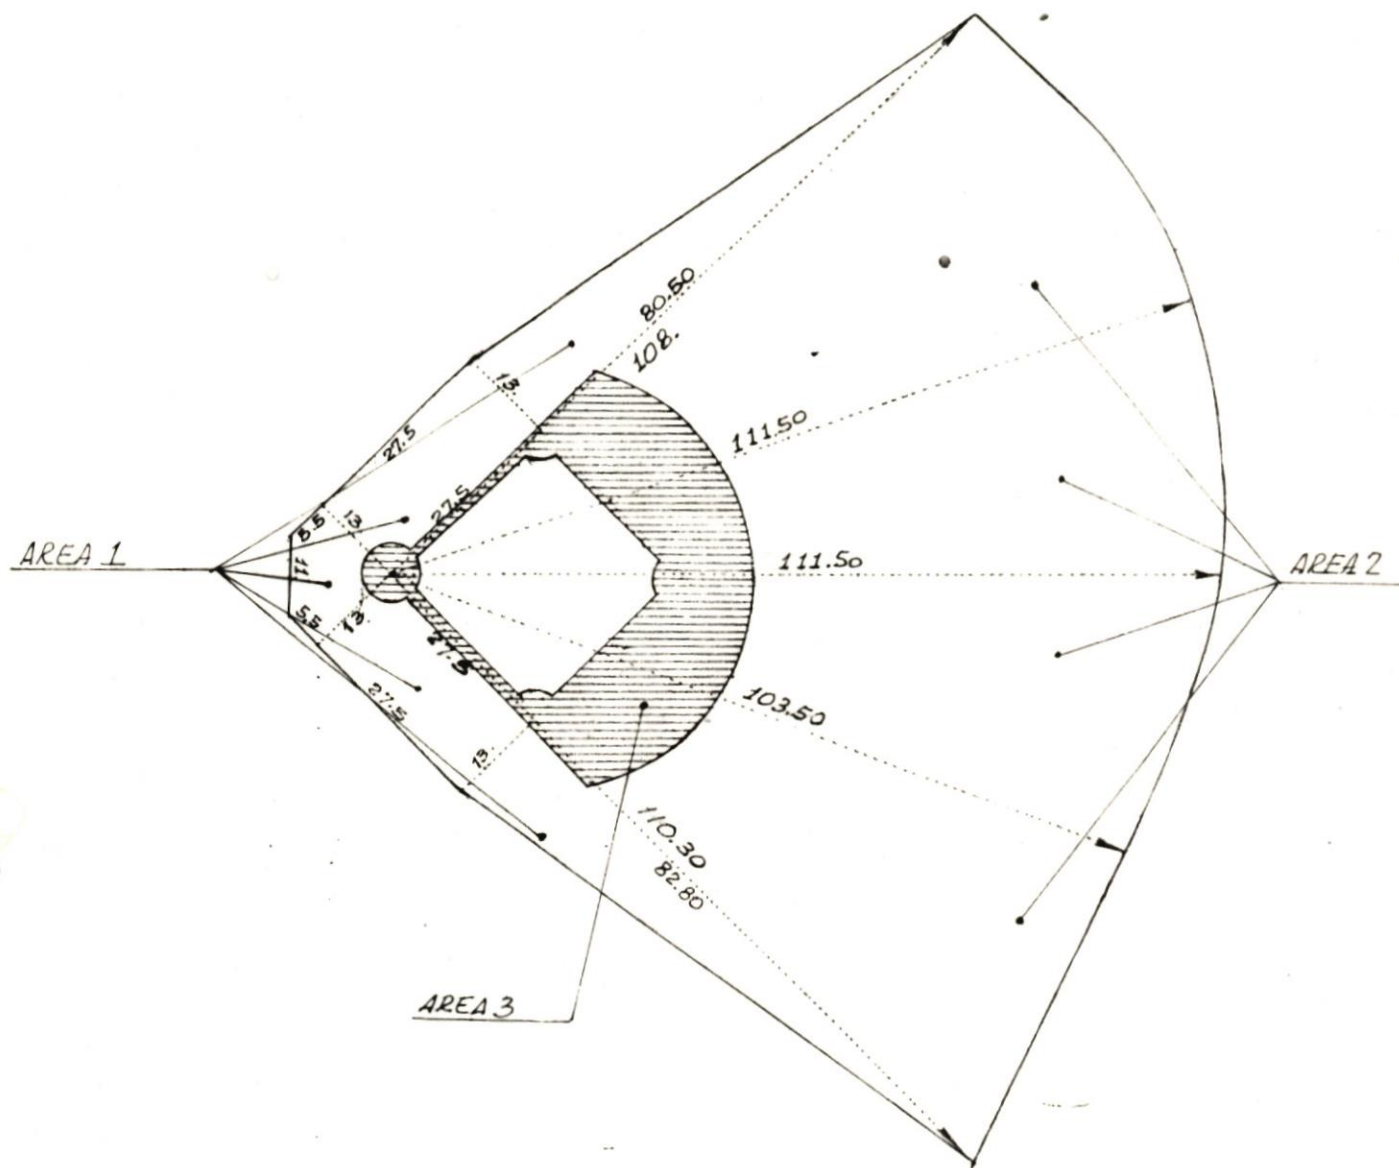
En consecuencia agradeceré a Uds. se sirvan cancelarme el saldo pendiente hasta los S/ 69'096,000.- a que alcanza el costo total valorizado, que incluye el Adicional de 500 m2 más sembrados de acuerdo a las indicaciones recibidas y el reintegro por alza de jornales dispuesto por la R.S.D. número 367-85 del 18/07/85 vigente a partir del 04 de Junio 1,985.

Asimismo agradeceré se sirvan devolverme el fondo de garantía que ha estado retenido por esta Obra.

Atentamente,


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
TECNICO FORESTAR.

11357 11358 11359 11360 11361 11362 11363 11364 11365 11366 11367 11368 11369 11370 11371 11372 11373 11374 11375 11376 11377 11378 11379 11380 11381 11382 11383 11384 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11392 11393 11394 11395 11396 11397 11398 11399 11400 11401 11402 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11409 11410 11411 11412 11413 11414 11415 11416 11417 11418 11419 11420 11421 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 11429 11430 11431 11432 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 11442 11443 11444 11445 11446 11447 11448 11449 11450 11451 11452 11453 11454 11455 11456 11457 11458 11459 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 11469 11470 11471 11472 11473 11474 11475 11476 11477 11478 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496 11497 11498 11499 11500 11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 11509 11510 11511 11512 11513 11514 11515 11516 11517 11518 11519 11520 11521 11522 11523 11524 11525 11526 11527 11528 11529 11530 11531 11532 11533 11534 11535 11536 11537 11538 11539 11540 11541 11542 11543 11544 11545 11546 11547 11548 11549 11550 11551 11552 11553 11554 11555 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 11564 11565 11566 11567 11568 11569 11570 11571 11572 11573 11574 11575 11576 11577 11578 11579 11580 11581 11582 11583 11584 11585 11586 11587 11588 11589 11590 11591 11592 11593 11594 11595 11596 11597 11598 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 11608 11609 11610 11611 11612 11613 11614 11615 11616 11617 11618 11619 11620 11621 11622 11623 11624 11625 11626 11627 11628 11629 11630 11631 11632 11633 11634 11635 11636 11637 11638 11639 11640 11641 11642 11643 11644 11645 11646 11647 11648 11649 11650 11651 11652 11653 11654 11655 11656 11657 11658 11659 11660 11661 11662 11663 11664 11665 11666 11667 11668 11669 11670 11671 11672 11673 11674 11675 11676 11677 11678 11679 11680 11681 11682 11683 11684 11685 11686 11687 11688 11689 11690 11691 11692 11693 11694 11695 11696 11697 11698 11699 11700 11701 11702 11703 11704 11705 11706 11707 11708 11709 11710 11711 11712 11713 11714 11715 11716 11717 11718 11719 11720 11721 11722 11723 11724 11725 11726 11727 11728 11729 11730 11731 11732 11733 11734 11735 11736 11737 11738 11739 11740 11741 11742 11743 11744 11745 11746 11747 11748 11749 11750 11751 11752 11753 11754 11755 11756 11757 11758 11759 11760 11761 11762 11763 11764 11765 11766 11767 11768 11769 11770 11771 11772 11773 11774 11775 11776 11777 11778 11779 11780 11781 11782 11783 11784 11785 11786 11787 11788 11789 11790 11791 11792 11793 11794 11795 11796 11797 11798 11799 11800 11801 11802 11803 11804 11805 11806 11807 11808 11809 11810 11811 11812 11813 11814 11815 11816 11817 11818 11819 11820 11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828 11829 11830 11831 11832 11833 11834 11835 11836 11837 11838 11839 11840 11841 11842 11843 11844 11845 11846 11847 11848 11849 11850 11851 11852 11853 11854 11855 11856 11857 11858 11859 11860 11861 11862 11863 11864 11865 11866 11867 11868 11869 11870 11871 11872 11873 11874 11875 11876 11877 11878 11879 11880 11881 11882 11883 11884 11885 11886 11887 11888 11889 11890 11891 11892 11893 11894 11895 11896 11897 11898 11899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 11916 11917 11918 11919 11920 11921 11922 11923 11924 11925 11926 11927 11928 11929 11930 11931 11932 11933 11934 11935 11936 11937 11938 11939 11940 11941 11942 11943 11944 11945 11946 11947 11948 11949 11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 11964 11965 11966 11967 11968 11969 11970 11971 11972 11973 11974 11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 11987 11988 11989 11990 11991 11992 11993 11994 11995 11996 11997 11998 11999 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019 12020 12021 12022 12023 12024 12025 12026 12027 12028 12029 12030 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12037 12038 12



CUADRO DE AREAS	
AREA 1	1,900 m ² .
AREA 2	9,450 m ² .
SUBTOTAL: 11,350 m ² .	
AREA 3 (ARCILLA)	850 m ² .
TOTAL: 10,500 m ² .	

ESCALA 1:1000



SERIE
AN 34133987

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Título Documento
FOLIO No 01

MEMORIA DESCRIPTIVA

AL : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OBRA : N° 0-85 SEMBRADO DE GRASS CAMPO DE BEISBOL
UBICACION : PARQUE ZONAL YAHUAR HUACA-BELLAVISTA CALLAO.

La ejecución del Sembrado de grass de este campo de Beisbol se ha realizado de acuerdo a mi propuesta de Abril 1985 y al Contrato celebrado el 16 Julio 1985, aprobado por Resolución N° 0522-AD-85 del 24 Setiembre 85.

Estos trabajos se han ejecutado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos, y Presupuesto Base y han comprendido lo siguiente:

I.- PREPARACION DEL TERRENO

- Eliminación de piedras y objetos extraños
- Remoción superficial necesaria del terreno con personal y tractor agrícola.
- Nivelación a mano del terreno para alcanzar las cotas fijadas por CORDECALLAO.
- Riego y tendido del agua proporcionada por el IPD.

II- SEMBRIO DE GRASS

- Refine ejecutado con rastrillos y niveletas.
- Esparcimiento del fertilizante: Urea Agrícola Tipo.
- Sembrío del grass bermuda de Primera.
- Riego de areas sembradas con agua proporcionada por el IPD.

III- MANTENIMIENTO DEL SEMBRIO HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 1,985

- Deshierbos
- Resiembre
- Ejecución del primer y Segundo corte con cortadora de grass.
- Riego de áreas sembradas con agua proporcionada por el IPD hasta el 20 de Noviembre 1,985.

IV- El costo de la Obra hasta la fecha ha sido determinada de la -



SERIE
A N° 34133988

siguiente manera:

1).- Monto contratado \$ 52'000,000

2).- Reintegro de alza de jornales

RDS N° 367-85 del 18/7/85 Re-

troactivo al 04/06/85

\$ 14'496,000

480 J_ornales

3).- Adicional resultante por ser

10,500 m² el área sembrada

según aparece del plano adjunto.

\$ 2'600,000

4).- Está por determinarse el reintegro


por aplicación de las fórmulas -

Polinómicas.

COSTO TOTAL

: 69'096,000

Lima, 09 de Diciembre de 1,985


JORGE QUISPE CHUQUILLURI.
TECNICO FORESTAR.

Callao, 09 de Diciembre de 1,985

INFORME Nº 05 JQCH - 85

A : ING. ALFREDO ROSSI
Director Infraestructura y Obras IPD/Lima

ASUNTO : Reajuste Monto Contrato

OBRA : Sembrío Grass Bermuda "COMPLEJO DEPORTIVO
YAHUAR HUACA".

REFERENCIA : Contrato Partes por Ejecutar obras entre IPD/
Jorge Quispe Chuquilluri, el suscrito ; el
16 de Julio de 1,985.

Adjunto al presente informo a Ud., en relación al Asunto, por contemplar la cláusula XI del Contrato en mención, que fija el Reglamento Único Licitaciones, para todo lo no contemplado explícitamente en este. Escogiendo el Índice CREPCO (039) Precios al Consumidor, como el justo parámetro para el cálculo respectivo. El mes de suscripción es Julio-85 y de Reajuste días 60 d.c. fijados en Contrato - a Setiembre - 85, a las.

Atentamente,


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
TECNICO FORESTAR.

SINDICATO DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL DEL CALLAO
 AFILIADOS A LA FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION
 CIVIL DEL PERU Y A LA C.G.T.P. JR. ZEPITA 322- CALLAO.

RETROACTIVO AL 4-6-85 R.Sub-D. # 367-85- 18/7/85

T A B L A D E S A L A R I O S 1 9 8 5 .

O P E R A R I O :

S. Basico S/. 36,659.42 X 6 = S/. 219,956.52
 S. Dominical..... = 36,659.42
 Desg. Herr. y R. S/. 4,300. X 6 = 25,800.00
 Movilidad S/. 6,083.00 X 6 = 36,498.00
 Sub-Total..... = S/. 318,913.94-
 Menos descuentos de ley:
 S.S.O.=3%, C.N.P. 3%, I.U.R.=
 2%, Fonavi= 0.5% y CONAFOVICER
 1% + 12.00..... = S/. 24,390.40
 294,523.54+
 Clausula de Reajuste a partir
 del 1-1-85 S/. 2,500. X 7 = 17,500.00
 Clausula a partir del 4-3-85
 1,500.00 X 7..... = 10,500.00
 TOTAL NETO A COBRAR..... = S/. 322,524.00!

O F I C I A L :

S. Basico S/. 32,291.42 X 6 = S/. 193,748.52
 S. Dominical..... = 32,291.42
 Desg. H. y R. 3,550.00 X 6 = 21,300.00
 Movilidad...6,080.00 X 6 = 36,498.00
 Sub-Total..... = S/. 283,837.94-
 Descuentos de Ley..... = 21,485.59
 262,352.35+
 1ra. Clausula 2,200.00 X 7 = 15,400.00
 2da. Clausula 1,300.00 X 7 = 9,100.00
 TOTAL NETO A COBRAR..... = S/. 286,852.35!

P E O N :

S. Basico S/. 29,908.42 X 6 = S/. 179,450.52
 Salario Dominical..... = 29,908.42
 Desg. H. y R. 2,500.00 X 6 = 15,000.00
 Movilidad..S/. 6,083.00..X.6 = 36,498.00
 Sub-Total..... = S/. 260,856.94-
 Descuentos de ley..... = 19,901.06
 240,955.88+
 1ra. Clausula 2,000.00 X 7 = 14,000.00
 3da. Clausula 1,200.00 X 7 = 8,400.00
 TOTAL NETO A COBRAR..... = S/. 263,356.00

P O R E L S I N D I C A T O :

BENEFICIOS SOCIALES (OP.)

POR DIA.....S/. 10,165.00
 POR 6 DIAS...S/. 60,990.00

AGUINALDOS X 28/7/85:

TOTAL.....S/. 1'016,485.50
 POR MES....S/. 145,212.21
 POR DIA....S/. 4,840.40

AGUINALDOS-NAVIDAD-1985:

TOTAL.....S/. 1'016,485.50
 POR MES....S/. 203,299.00
 POR DIA....S/. 6,777.00

LIQUIDACION POR HORA EXTRA:

15%.....S/. 762.00

BENEFICIOS SOCIALES (OF.)

POR DIA.....S/. 8,948.00
 POR 6 DIAS..S/. 53,688.00

AGUINALDOS X 28/7/85:

TOTAL.....S/. 894,748.00
 POR MES...S/. 127,821.00
 POR DIA...S/. 4,261.00

AGUINALDOS NAVIDAD 1985:

TOTAL....S/. 894,748.00
 POR MES..S/. 178,950.00
 POR DIA..S/. 5,965.00
 LIQUIDACION X HORA EXTRA:
 15%.....S/. 671.00

BENEFICIOS SOCIALES (PEON)

POR DIA...S/. 8,277.00
 POR 6 DIAS/. 49,663.00

AGUINALDOS X 28/7/85:

TOTAL.....S/. 827,710.00
 POR MES..S/. 118,244.00
 POR DIA..S/. 3,941.00

AGUINALDOS NAVIDAD 1985.

TOTAL.....S/. 827,710.00
 POR MES...S/. 165,542.00
 POR DIA...S/. 5,518.00

LIQUIDACION POR HORA EXTRA:

15%.....S/. 621.00

JOSE CALLAO HERRERA
 Sec. General.

AUGUSTO RAMOS DOLMOS
 Sec. de Defensa.

JESUS RAMIREZ ALEJO
 Sec. de Economia.

	<u>TOTAL:</u>	<u>MENSUAL:</u>	<u>SEMANAL:</u>	<u>POR DIA:</u>
OPERARIO				
OPERARIO: S/.	569,232.88	S/. 47,543.60	S/. 17,007.00	S/. 12,581.50
OFICIAL : S/.	501,080.00	S/. 41,757.00	S/. 9,754.00	S/. 1,392.00
PEON : S/.	463,517.00	S/. 38,626.00	S/. 9,016.00	S/. 1,288.00

SISTEMA DE PAGOS DE HORAS EXTRAS Y EXTRAORDINARIAS:

	<u>HORA NORMAL</u>	<u>H. AL 60%</u>	<u>H. AL 100%.</u>
OPERARIO : S/.	5,082.00	S/. 8,132.00	S/. 10,165.00
OFICIAL : S/.	4,474.00	S/. 7,158.00	S/. 8,948.00
PEON : S/.	4,139.00	S/. 6,623.00	S/. 8,278.00

A CONTINUACION PRESENTAMOS LA TABLA DE SALARIOS PARA LOS CASOS EN QUE LAS EMPRESAS PAGUEN CON TODOS LOS BENEFICIOS, COMO ES EL CASO DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS QUE VIENEN LABORANDO PARA LA CORPORACION DE DESARROLLO DEL CALLAO VIGENTE DEL 4-6-85 al 31-12-85.-

OPERARIO:

Semana normal.....S/.	322,524.00 ⁺
Más el 25% de Liquidación.....S/.	60,990.00
Más Gratificaciones de Navidad-85.....S/.	47,439.00
TOTAL NETO A COBRAR.....S/.	430,953.00

OFICIAL:

Semana Normal.....S/.	286,852.00
Más el 25% de Liquidaciones.....S/.	53,688.00
Más Gratificaciones por Navidad-1985....S/.	41,755.00
Total neto a cobrar.....S/.	382,295.00

PEON:

Semana normal.....S/.	263,356.00
Más 25% de Liquidaciones.....S/.	49,663.00
Más Gratificaciones Navidad-1985.....S/.	38,626.00
Total neto a cobrar.....S/.	351,645.00

ALGUNAS ORIENTACIONES:

- 1.- Esta tabla de Salarios es vigente desde el 4-6-85 hasta el 31-12-85.
- 2.- Cuando los trabajadores se vean estafados en sus pagos por parte de algunas malas empresas Constructoras, estén organizados en Comites de obra, o en caso de no estar organizados en obra, pueden de igual forma hacercarse a nuestro Local Sindical sito en Jr. Zepita 372-Callao - 2do piso Int. # 4. para solicitar la asesoria y defensa sindical, para que en esta forma forma el Patrón no se coma nuestros beneficios, con el Sindicato al Frente.-
- 3.- LOS REINTEGROS RETROACTIVOS AL 4-6-85 SON: POR DIA;
 OPERARIO: 20,000.00 + 3,000.00 + 4,750.00 + 5,000.00...= S/. 32,750.00
 OFICIAL : 18,000.00 + 2,500.00 + 4,750.00 + 4,500.00...= S/. 29,750.00
 PEON : 17,000.00 + 1,650.00 + 4,750.00 + 4,250.00 = S/. 27,650.00
 (S. Basico) (H.yR.) (Movilidad) (Liqu.) (Total)

ESTAMOS SUMANDO: Salario basico, Desgaste de Herramienta, Movilidad y el 25% de Liquidación por día. La Gratificación -se paga con el último Jornal proveniente del Pliego 1985.

25/7/85.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN R E D — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: QUISPE CHUQUILLURI JORGE		NUMERO 5831	
		SOLICITUD DE 19-12-85		REF:	
Fecha de INGRESO: 19/12/85		ASUNTO: Contratista del Sembrado de Grass del Parque Zonal Yahuar Huaca, adjunta Análisis de Reintegro por Alza de Jornales, El Análisis de Mano de Obra y el Presupuesto sobre el que se aplica y, que le han sido solicitados.			
Hora: 2:00 pm					
Numero de Folios: (07) SIETE					
Registrado por: <i>Ramos</i>					
Pase a:					
Remitido por:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No. 5831	
Recibido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Fecha		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Hora		☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR			
		Observaciones:			
		5			

Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No. 5831	
Remitido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Fecha		☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR			
Hora		Observaciones:			
		4			

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES INRED HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : QUISPE CHUQUILLURI JORGE		NUMERO REF:	
Fecha de INGRESO: 19/12/85		SOLICITUD DE 19-12-85			
Hora: 2:00 PM		ASUNTO: Contratista del Sembrado de Grass del Parque Zonal Yahuar Huaca, adjunta Análisis de Reintegro por Alza de Jornales, El Análisis de Mano de Obra y el Presupuesto sobre el que se aplica y, que lo han sido sellados.			
Numero de Folios: (07) SICTE					
Registrado por: Roman					
Pase a:					
Remitido por:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No.	
Recibido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Fecha		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Hora		☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR			
Observaciones:		5			

Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No.	
Remitido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Fecha		☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR			
Hora		Observaciones:			
		4			

Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No.	
Remitido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Fecha		☐ AUTORIZACION ☒ TRAMITAR			
Hora		Observaciones:			
		3			

Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No.	
Remitido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Fecha		☐ AUTORIZACION ☒ TRAMITAR			
Hora		Observaciones:			
		2			

Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR		No.	
Remitido por:		☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION			
Fecha		☐ AUTORIZACION ☒ TRAMITAR			
Hora		Observaciones:			
		1			

Lima, 19 de Diciembre de 1985

Señores
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento
LIMA. -



JORGE QUISPE CHUQUILLURI, con L.E.# 07433884
y con domicilio en Sebastian Barranca N° 1933 Dpto. 201 - La Vic-
totia, Contratista del Sembrado de Grass del Parque Yahuar Huaca,
me dirijo a Ustedes, presentándoles el Analisis del Reintegro por
alza de jornales, El Analisis de Mamo de Obra y el Presupuesto so-
bre el que se aplica y, que me han sido solicitados para completar
la Memoria Descriptiva valorizada que he presentado con mi comunica-
ción del 09 de los corrientes y, para dar curso a mi liquidación
final por dicha Obra y devolución del fondo de garantía correspon-
diente.

Atentamente,

JORGE QUISPE CHUQUILLURI

(02)

Lima, 19 de Diciembre de 1985

Señores
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento
LIMA.-

JORGE QUISPE CHUQUILLURI, con L.E. # 07433884
y con domicilio en Sebastian Barranca N° 1933 Dpto. 201 - La Vic-
toria, Contratista del Sembrado de Grass del Parque Vahuar Huaca,
me dirijo a Ustedes, presentándoles el Analisis del Reintegro por
alza de jornales, El Analisis de Plano de Obra y el Presupuesto so-
bre el que se aplica y, que me han sido solicitados para completar
la Memoria Descriptiva valorizada que he presentado con mi comunica-
ción del 09 de los corrientes y, para dar curso a mi liquidación
final por dicha Obra y devolución del fondo de garantía correspon-
diente.

Atentamente,


JORGE QUISPE CHUQUILLURI

CALCULO DEL REINTEGRO POR ALZA DE JORNALES

	<u>NUMERO DE JORNALES</u>
Preparación del terreno	: 60 de operarios y 180 de peones
Sembrío de grass	: 105 de operarios y 75 de peones
Riego y Resiembra	: 60 de operarios

<u>TOTAL DEL NUMERO DE JORNALES:</u>	225 de operario
	255 de peones
	480 jornales

CALCULO DEL REINTEGRO:

Por operario S/. 32,750.=

Por peón S/. 27,650.=

Por 225 jornales de operarios : $225 \times 32,750 =$ S/. 7'368,750.=

Por 255 jornales de peón : $225 \times 27,650 =$ S/. 7'050,750.=


Sub-Total S/. 14'419,500.=

Por 1 Maestro encargado de Dirección

Técnica : 30 jornales x S/. 32,750.= S/. 15'401,000.=

=====

Lima Diciembre 1, 1985


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
Técnico Forestal

CALCULO DEL REINTEGRO POR ALZA DE JORNALES

	<u>NUMERO DE JORNALES</u>
Preparación del terreno	: 60 de operarios y 180 de peones
Sembrío de grass	: 105 de operarios y 75 de peones
Riego y Resiembra	: 60 de operarios

<u>TOTAL DEL NUMERO DE JORNALES:</u>	225 de operario
	255 de peones
	480 jornales

CALCULO DEL REINTEGRO:

Por operario S/. 32,750.=

Por peón S/. 27,650.=

Por 225 jornales de operarios : $225 \times 32,750 =$ S/. 7'368,750.=

Por 255 jornales de peón : $225 \times 27,650 =$ S/. 7'050,750.=

Sub-Total S/. 14'419,500.=

Por 1 Maestro encargado de Dirección

Técnica : 30 jornales x S/. 32,750. = S/. 15'401,000.=

=====

Lima Diciembre 1, 985


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
Técnico Forestal

24

ANALISIS DE MANO DE OBRA

Preparación del Terreno :

2 operarios X 30 días = 60 días

6 peones X 30 días = 180 días

Sembrío de Gras :

7 operarios X 15 días = 105 días

5 peones X 15 días = 75 días


Riego y Resiembra :

2 operarios X 30 días = 60 días

TOTAL DE DIAS :

Total de Jornales = 480 jornales.

Lima, Abril 1, 1985


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
Técnico Forestal

ANALISIS DE MANO DE OBRA

Preparación del Terreno :

2 operarios X 30 días = 60 días

6 peones X 30 días = 180 días

Sembrio de Gras :

7 operarios X 15 días = 105 días

5 peones X 15 días = 75 días

Riego y Resiembra :

2 operarios X 30 días = 60 días

TOTAL DE DIAS :

Total de Jornales = 480 jornales.

Lima, Abril 1, 1985



JORGE QUTSPE CHUQUILLURI

Técnico Forestal

PRESUPUESTO POR M2. POR SEMBRIO DE GRASS

PREPARACION DEL TERRENO

Mano de Obra	S/. 540.	
Máquinaria y Herramienta	460.	S/. 1000,
Dirección Técnica-Maestro	S/.	S/. 100.

SEMBRIO DE GRASS

Grass de primera	S/. 1800	
Mano de Obra	700	
Urea y Herramientas	200	S/. 2700.
Dirección Técnica -Maestro		S/. 270.

RIEGO Y RESIEMBRE

Grass de primera	S/. 200.	
Mano de Obra	200.	
Herramientas	60.	S/. 460.
		S/. 46.
Sub-Total		S/. 4,576.
(13.6 %) Gastos Generales y Utilidad	S/. 624.	
		S/. 5,200.
		=====

Lima Abril 1, 985


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
Técnico Forestal

(4)

PRESUPUESTO POR M2. POR SEMBRO DE GRASS

PREPARACION DEL TERRENO

Mano de Obra	S/. 540.	
Máquinaria y Herramienta	460.	S/. 1000.
Dirección Técnica-Maestro	S/.	S/. 100.

SEMBRIO DE GRASS


Grass de primera	S/. 1800	
Mano de Obra	700	
Urea y Herramientas	200	S/. 2700.
Dirección Técnica -Maestro		S/. 270.

RIEGO Y RESEMBRE

Grass de primera	S/. 200.	
Mano de Obra	200.	
Herramientas	60.	S/. 460.
		S/. 46.
Sub-Total		S/. 4,576.
(13.6 %) Gastos Generales y Utilidad	S/.	624.
		S/. 5,200.

=====

Lima Abril 1, 1985


JORGE QUISPE CHUQUILLURI
Técnico Forestal

A-5 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION, DESCRIPCION Y METAS POR TRIMESTRE

1	FECHA		
24	01	20	11

VOLUMEN	2	Código	Nombre:	SECTOR	3	Código	Nombre:	8	PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO
			Instituciones Públicas				EDUCACIÓN		NULVAS INICIACIÓN	
PLIEGO	4	Código	Nombre:	UP	5	Código	Nombre:			
			INST. PERUANO DEL DE				INST. PERUANO DEL DEPOR			
PROGRAMA	6	Código	Nombre:	E.E.P. DE	7	Código	Nombre:			
			Funcionamiento				Proyectos del ID			

Construcción de infraestructura deportiva a iniciarse en el presente año.

ESTADIO MODELO YUNGUYO

ESTADIO PAMPAS

BOLISEO CERRADO DE CALCA

ESTADIO EN TINGO MARIA

COLISEO CERRADO JAULA

ESTADIO CERRO DE PASCO

COLESEGO CERRADO CAJAMARCA

ESTADIO ZONA SIERRA

GYMNASIO DE CHICLAYO

13 METAS A CONSEGUIR, CUANTIFICADAS		14 UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S					18 TOTAL AÑO
CODIGO			15 PRIMER TRIMESTRE	16 SEGUNDO TRIMESTRE	17 TERCER TRIMESTRE	18 CUARTO TRIMESTRE		
0.1	CONSTRUCCION ESTADIOS	UN	540,	542,	542,	543,	2'167,	
0.2	CONSTRUCCION COLIBROS	UN	300,	300,	300,	300,	1'200,	
0.3	CONSTRUCCION CARREROS	UN	125,	125,	125,	125,	500,	
0.4								
0.5								
0.6								
0.7								
0.8								
0.9								

Elaborado por: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

Telefono: 32991

Ex. DE: JAVIER AGUILAR F. 329177

Aprobado por: *[Signature]*

NOTA: Prețurile în lei cotate în 7 la EEP de Gestiune Curiente și de Inventar, astfel încât să se

—2—

RESOLUCION N-034-AD-88

APROBACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 36

A-5 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION, DESCRIPCION Y METAS POR TRIMESTRE

FECHA 24 01 81 1 1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

VOLUMEN 2	Código Nombre: INSTITUCIONES PUBLICAS	SECTOR 3	Código Nombre: EDUCACION	PROYECTO DE INVERSION	Código
PLIEGO 4	Código Nombre: INSTITUTO PER. DEL DEPTO.	UP 5	Código Nombre: INST. PERUANO DEL DEPTO.		
PROGRAMA 6	Código Nombre: FUNDACIONES	E.E.P. DE 7	Código Nombre: UNIV. DEL L.		

12 DESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO O DE LAS ACTIVIDADES DEL GASTO CORRIENTE:

Mejoramiento de infraestructura existente.
ESTADIO NACIONAL
VILLA DEPORTIVA NACIONAL
ESTADIOS, COLISEOS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS

13 METAS A CONSEGUIR, CUANTIFICADAS			14 UNIDAD DE MEDIDA					M E T A S				
CÓDIGO								15 PRIMER TRIMESTRE	16 SEGUNDO TRIMESTRE	17 TERCER TRIMESTRE	18 CUARTO TRIMESTRE	19 TOTAL AÑO
0.1	ESTADIOS	UN						469	471	473	469	1'882
0.2	COLISEOS	UN						135	135	135	135	540
0.3	COMPLEJOS DEPORTIVOS	UN						225	225	225	225	900
0.4												
0.5												
0.6												
0.7												
0.8												
0.9												

Elaborado por: Sr. JAVIER LEON P. 349177-25

Revisado por: Sr. JAVIER LEON P. 32177-25

Aprobado por:

NOTA: Proyectar en el cuadro 7 la E.P. de Gasto Corriente o de Inversión, según corresponda.

APROBACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 1986
A-86 PROYECTOS DE INVERSION POR CONTRATA Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

(MILES DE NTS.)

AREA 0 Código 1 FECHA 2 4 0 1 8 6

VOLUMEN 2 2 INSTITUCIONES PUBLICAS		SECTOR 3 3 EDUCACION		PROYECTO DE INVERSION CODIGO	
PLIEGO 4 1 1 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE		UP 0 1 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE			
OBJETO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA		TIPO CONTRATO		PLAZO	
ESTUDIOS DE INGENIERIA		PF		8m	
CODIGO		FECHA FIRMA BUENA PRO O CONTRATO		FECHA PPTO BASE ORIGINAL	
CODIGO		INICIO		DURACION	
TOTAL CONTRATA					

ESTRUCTURA DE GASTO		MODALIDAD DE CONTRATO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
PRESUPUESTO 1986				INGRESOS PROPIOS		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	
CONTRATO		P.F.	P.U.	ENDEUDAMIENTO			
				TESORO PUBLICO	INGRESOS PROPIOS	INTERNO	EXTERNO
ESTUDIOS		463,	463,		463,		
OBRAS							
BIENES DE CAPITAL							
SUB-TOTAL		463,	463,		463,		
ESTUDIOS							
OBRAS							
BIENES DE CAPITAL							
SUB-TOTAL							
ESTUDIOS							
OBRAS							
BIENES DE CAPITAL							
SUB-TOTAL							
TOTAL CONTRATA		463,	463,		463,		

Elaborado por JAVIER LEON PAREJA Telefono 329177-25 Revisado por JAVIER DOMITIAN FRANCO Telefono 329177-25 Aprobado por

APROBACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 1986
A - 5 PROYECTOS DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA
Y SU FINANCIAMIENTO
(MILES DE INTIS)

FECHA 24 01 86

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

VOLUMEN	2	Código	Nombre	SECTOR	3	Código	Nombre	PROYECTO DE INVERSION	CODIGO
	2		INSTITUCIONES PUBLICAS		1	3	EDUCACION	OBRA DE CONSTRUCCION	
PLIEGO	4	Código	Nombre	UP	5	Código	Nombre		
	1	1	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE		01		INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE		

12	13 ANALITICO DE ADMINISTRACION DIRECTA					14	15	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
PRESUPUESTO 1986	REMUNERACIONES	BIENES	SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	BIENES DE CAPITAL	PRESUPUESTO 1986 POR ASIGNACIONES GENERICAS	TESORO PUBLICO	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
									INTERNO	EXTERNO	TESORO	ENDEUDAMIENTO	DONACIONES
600,						07.00							
						08.00	600,	600,					
						09.00							
						TOTAL							

16	17	18	19	20	21
ORDEN	SUB - PROYECTOS Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO	FECHA DEL PERIODO DE EJECUCION	EJECUCION REAL A 1984	EJECUCION ESTIMADA 1985	SALDO POR EJECUTAR A PARTIR DE 1987
		INICIO	TERMINO		
01	ESTADIO ILAVE-PUNO	MARZO 86	JUL 86	187,	400,
02	ESTADIO PACASMAYO-LA LIBERTAD	MARZO 86	JUL 86	337,	200,
03					
04					
05					
06					
07					
08					
TOTAL					

22		23 F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O							24 A N A L I T I C O D E A D M I N I S T R A C I O N D I R E C T A					
ORDEN	ESTRUCTURA DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE SUB - PROYECTOS Y/O COMPONENTES	PRESUPUESTO 1986	TESORO PUBLICO	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS			REMUNERAC.	BIENES	SERVICIOS	TRANSFEREN CORRIENTES	BIENES DE CAPITAL
					INTERNO	EXTERNO	TESORO	ENDEUDAM	DONACIONES					
01	ESTADIO ILAVE	400,		400,										
02	ESTADIO PACASMAYO	200,		200,										
03														
04														
05														
06														
07														
08														
TOTAL		600,		600,										

Elaborado por: Sr. JAVIER LEON BARTAN **Telefono:** 329177-25
Revisado por: Sr. JAVIER AGUIRRE FRANCO **Telefono:** 329177-35
Aprobado por: _____

APROBACION DEL FUNCIONAL PRESUPUESTO 1986
A-94 PROYECTOS DE INVERSION POR CONTRATA Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

(MILES DE UIT'S)

AREA 0 Código
 FUNCIONAL

1 FECHA
 24 01 86

Pág 11

VOLUMEN		2 Cód. Nombre 2 INSTITUCIONES PUBLICAS		SECTOR		1 3 Cód. Nombre 1 3 EDUCACION		PROYECTO DE INVERSION CODIGO																					
PLIEGO		11 Cód. Nombre 11 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE		UP		01 Cód. Nombre 01 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE		LINEA DE CONTINUACION																					
12 OBJETO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA				13 TIPO CONTRATO		14 FECHA FIRMA BUENA PNO O CONTRATO		15 FECHA PPTC BASE ORIGINAL		16 PLAZO		17 MONTO TOTAL (PRECIO BASE ORIGINAL)		18 EJECUCION REAL A 1984 (P.BASE ORIGINAL)		19 EJECUCION ESTIMADA 1985 (P.BASE + ESCALAS ORIGINAL)		20 EJEC. TOTAL C.S. 1986 (PRECIO BASE ORIGINAL)		21 PPTO. 1986 (PRECIO BASE A DIC 85)		22 K1		23 L1		24 PPTO. 1986 (PRECIO BASE A DIC 85)		25 SALDO A PARTIR 1987	
C O D I G O COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN DE				PF		MAR		ENERO ABR.		5m				7,				200,						200,					
C O D I G O																													
C O D I G O																													
TOTAL CONTRATA																													

26 ESTRUCTURA DE GASTO		27 PRESUPUESTO 1986	28 MODALIDAD DE CONTRATO		29 FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
			PF	PU	TESORO PUBLICO	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
							INTERNO	EXTERNO	TESORO	ENDEUDAMIENTO	DONACIONES
COD	CONTRATO										
	ESTUDIOS										
	OBRAS	200,	200,			200,					
	BIENES DE CAPITAL										
	SUB-TOTAL	200,	200,			200,					
COD	CONTRATO										
	ESTUDIOS										
	OBRAS										
	BIENES DE CAPITAL										
	SUB-TOTAL										
COD	CONTRATO										
	ESTUDIOS										
	OBRAS										
	BIENES DE CAPITAL										
	SUB-TOTAL										
	TOTAL CONTRATA	200,	200,			200,					

Elaborado por: Sr. JAVIER LUIS RAMAN Telefonos: 329177-25 Revisado por: Sr. JAVIER LUIS RAMAN Telefonos: 329177-25 Aprobado por: 11

APROBACION INSTITUCIONAL. PRESUPUESTO 1986
A-6a PROYECTOS DE INVERSION POR CONTRATA Y FINANCIAMIENTO

AREA	0	Código	1	FECHA	1	1
FUNCIONAL				24	01	86

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

VOLUMEN	2	Código	Nombre:	INSTITUCIONES PUBLICAS	SECTOR	13	Nombre:	EDUCACION	PROYECTO DE INVERSION	CODIGO																									
PLIEGO	1	Código	Nombre:	INST. PER. DEL DEPORTE	UP	01	Nombre:	ISNT. PER. DEL DEPORTE	OBRAS DE CONTINUACION																										
OBJETO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA					15	TIPO CONTRATO	14	FECHA FORMAL BUENA PRO O CONTRATO	16	FECHA PPTO. BASE ORIGINAL	17	PLAZO	18	MONTO TOTAL (PRECIO BASE ORIGINAL)	19	RECUP. REAL A 1984 (P. BASE ORIGINAL)	20	RECUP. ESTIMADA 1985 (P. BASE ORIGINAL)	21	FECHA TOTAL ESTIMADA (PRECIO BASE + ESCALAS)	22	PPTO. 1986 (PRECIO BASE ORIGINAL)	23	K.	24	L1	25	PPTO. 1986 (PRECIO BASE A DEC 85)	26	BALDO A PARTIR 1987	27	P. BASE ORIGINAL	28	P. BASE ORIGINAL A DEC. 86	
COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EL SALVADOR					PF	MAR	ENE	ABR	4 m.											200,			200,												
CODIGO																																			
CODIGO																																			
TOTAL CONTRATA																																			

ESTRUCTURA DE GASTO		27	28	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
PRESUPUESTO 1986		MODALIDAD DE CONTRATO		TESORO PUBLICO		INGRESOS PROPIOS		ENDEUDAMIENTO		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	
		P.F.	P.U.			INTERNO	EXTERNO	TESORO	ENDEUDAMIENTO	DONACIONES	
COD.	CONTRATO :										
	ESTUDIOS										
	OBRAS	200,	200,		200,						
	BIENES DE CAPITAL										
	SUB-TOTAL	200,	200,		200,						
COD.	CONTRATO :										
	ESTUDIOS										
	OBRAS										
	BIENES DE CAPITAL										
	SUB-TOTAL										
COD.	CONTRATO :										
	ESTUDIOS										
	OBRAS										
	BIENES DE CAPITAL										
	SUB-TOTAL	200,	200,		200,						
	TOTAL CONTRATA										

Revisado por:	JAVIER LEON FARFAN	Teléfono	29177-25	Revisado por:	JAVIER AGUILAR FRANCO	Teléfono	29177-85	Aprobado por:	
---------------	--------------------	----------	----------	---------------	-----------------------	----------	----------	---------------	--
